Erschließung Neue Mitte - Bauablaufplan

Stand: 04.11.2022
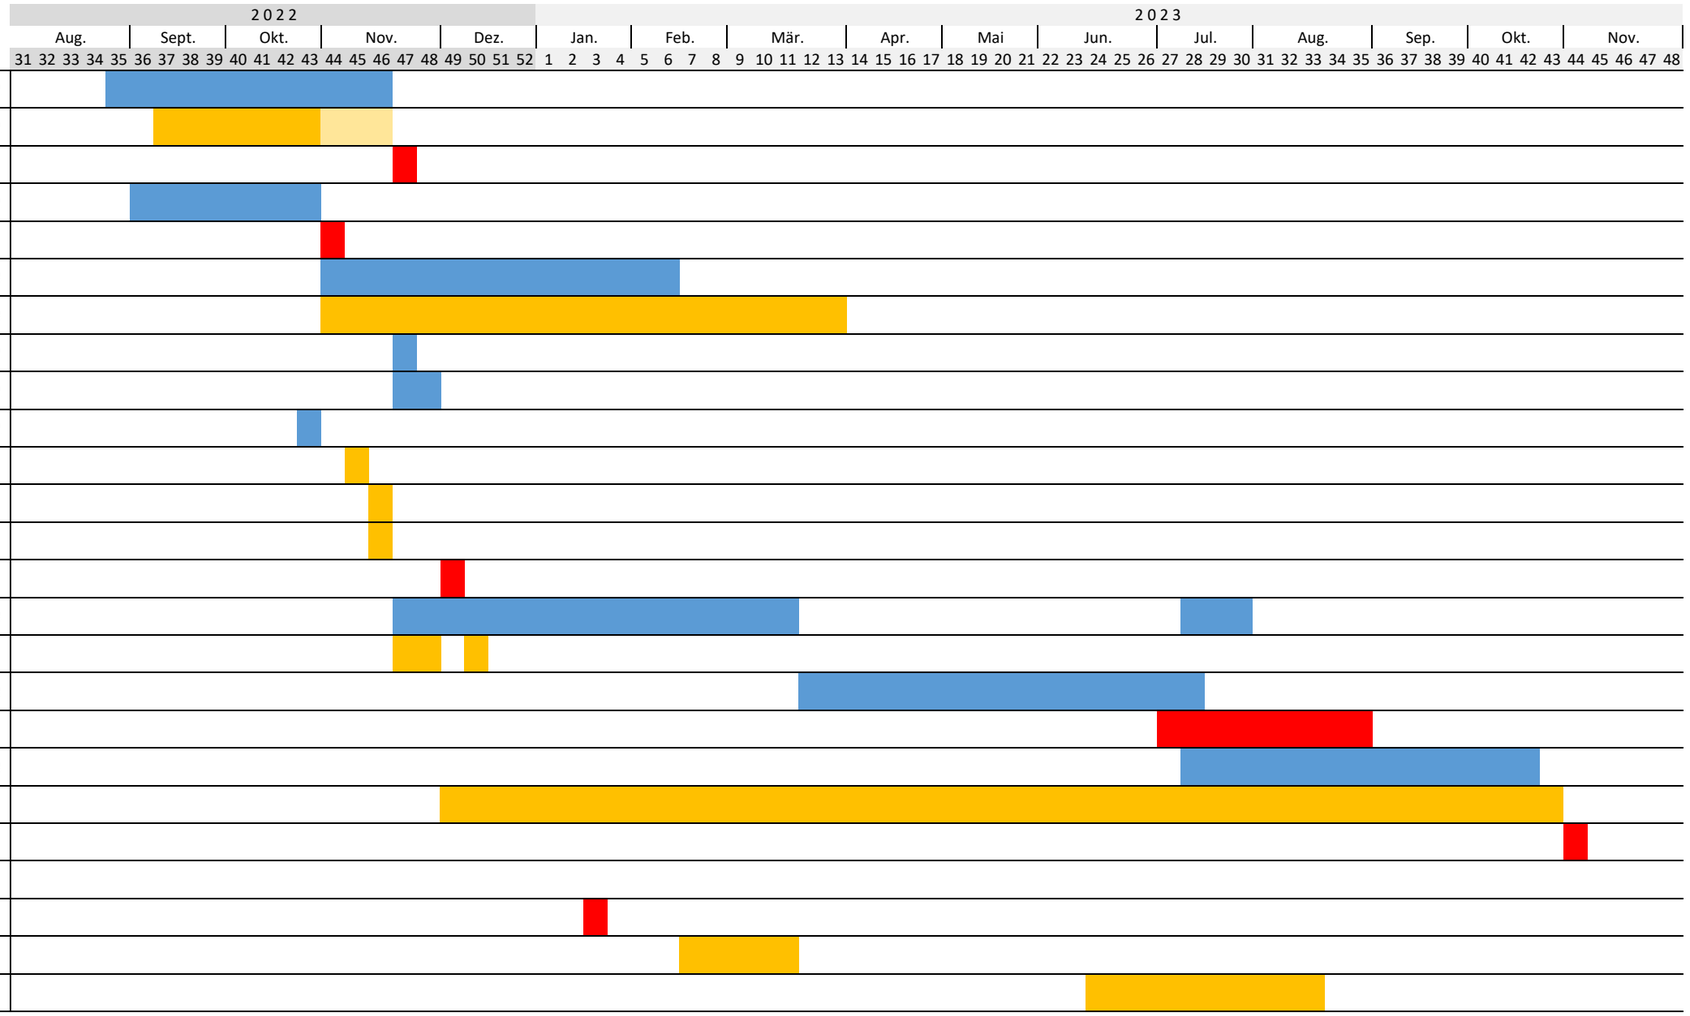
			START	ENDE
01	**MITTELSPANNUNGSTRASSE**	Neue Stromleitung Z/Q1	30.08.2022	18.11.2022
	Beeinträchtigung Botan. Garten	Sperrung Waldweg bis Ende KW 46	12.09.2022	30.09.2022
	Umschluß MS-Trasse		22.11.2022	
02	**PROVISOR. BUSHALTESTELLE**	P-Nord, Linie 9/11	05.09.2022	31.10.2022
	Inbetriebnahme 02		31.10.2022	
03	**STRASSE NORDRING**	bei ZS	01.11.2022	10.02.2023
	Halbseitige Sperrung	Eggerhaldestrasse bei Geb Z (50 m)	28.10.2022	31.03.2023
	Spundwand bei ZS	besonders Lärm-/Erschütt.-intensiv	21.11.2022	25.11.2022
04	**TEMPORÄRE BAUSTRASSE**	Campusmitte	01.11.2022	30.11.2022
	Baustelleneinrichtung	süd-westl. W	27.10.2022	28.10.2022
	Räumung Biergarten		07.11.2222	
	Räumung Kurzzeitparkplätze	südl. Geb. W (Kinderhaus/ Barriere.)	18.11.22	
	Räumung Motorradstellplätze	südl. Geb. W	18.11.22	
	Inbetriebnahme 04		05.12.2022	
05	**KANALARBEITEN**	Schmutzwasser/ Regenwasser	23.11.2022	26.07.2023
	Vollsperrung	Physikstrasse bei PZ	KW 47/48	KW 51
06	**TECHNIKTUNNEL**		23.03.2023	13.07.2023
	Umschluß Heiztrasse		Juli/ Aug 23	
07	**STRASSE/ NEUE BUSHALTESTELLE**		11.07.2023	16.10.2023
	Vollsperrung Zufahrtsstrasse	Campusmitte	05.12.2022	Okt. 23
	Inbetriebnahme 07		Nov. 23	
08	**BETRIEBSEINSCHRÄNKUNGEN**			
	Umzug Müllsammelstelle	Baufreiheit Techniktunnel	Jan. 23	
	Einschränkung Anlieferhof/Helium	durch Kanalarbeiten	Feb. 23	März 23
	Einschränkung Anlieferhof/Helium	durch Techniktunnel	Juni 23	Aug. 23
